

中央水利建设投资统计 月报 (十月)

水利部规划计划司

2013年11月6日

截至2013年10月31日,2013年累计安排中央水利投资计划1328.6亿元(不包含山洪灾害防治43亿元,农发资金用于水保6.4亿元及农发资金用于中型灌区15.3亿元),其中中央预算内投资729.3亿元,主要安排农村饮水安全工程225亿元、大中型病险水库(闸)除险加固25亿、灌区建设与节水改造工程92亿元、重大水利工程387.3亿元;中央财政水利专项资金599.2亿元,主要安排中小河流治理218亿元、小型病险水库除险加固110亿元、小型农田水利建设240.3亿元、水土保持13亿元,农村水电增效扩容17.9亿元。

2012年累计安排中央水利投资计划1623亿元,纳入月报统计的中央投资1564.5亿元,其中中央预算内投资918.6亿元,中央财政水利专项资金645.9亿元。

一、投资计划下达情况

2013年中央预算内水利投资729.3亿元,要求地方配套投资678.9亿元。已下达到项目单位中央投资计划682.0亿元、地

方配套投资计划 645.1 亿元，投资计划下达率分别为 93.5%和 95.0%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程和重大水利工程分别下达中央投资 218.4 亿元、24.9 亿元、81.7 亿元和 357.1 亿元，投资计划下达率分别为 97.0%、99.5%、88.8%和 92.2%。


2013 年中央财政水利专项资金预算共 599.2 亿元，已分解下达项目单位 382.8 亿元，预算分解下达率为 63.9%。其中中小河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 183.2 亿元、44.4 亿元、128.4 亿元、10.97 亿元和 15.8 亿元，预算分解下达率分别为 84.0%、40.4%、53.4%、84.4%和 88.4%。

2012 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资计划 1563.7 亿元、地方配套投资计划 1299.6 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和 106.7%。其中，水毁工程、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设项目中央投资计划尚未完全下达，中央投资计划下达率分别为 98.2%，99.9%和 99.9%。

二、资金到位情况

2013 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资 646.7 亿元、地方配套投资 381.0 亿元，到位率分别为 88.7%和 56.1%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工


图1 2013年中央预算内投资地方配套投资拨付率
(按地区分)

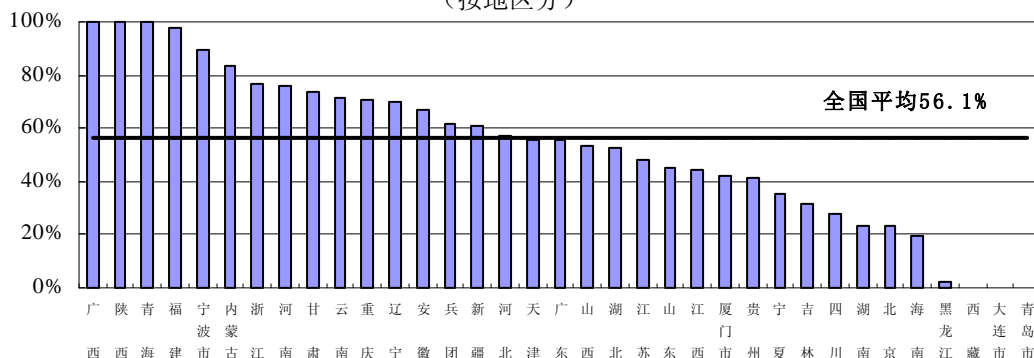

程分别拨付到位地方配套投资 74.5 亿元、7.2 亿元、21.3 亿元、278.1 亿元，到位率分别为 75.0%、51.4%、37.6%和 54.6%。

2013 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金 359.1 亿元、地方配套资金 152.5 亿元，到位率分别为 59.9%和 63.1% (见图 2)。

图2 2013年中央财政水利专项投资计划地方
配套投资拨付率

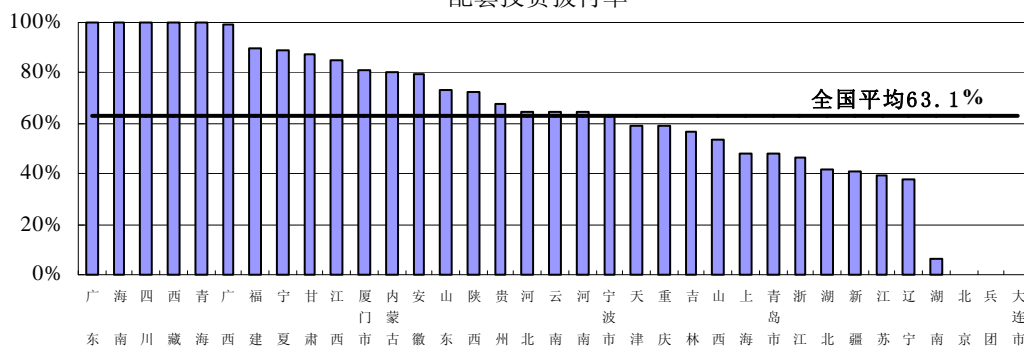

2012 年中央水利建设投资累计拨付到项目单位 2757.2 亿元，其中拨付中央投资 1560.0 亿元，到位率 99.7%；拨付地方配套投资 1197.2 亿元，到位率 98.3%。

三、项目开工情况

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 10323


个，其中中央预算内水利建设投资计划 4770 个，中央财政水利专项资金 5553 个。共有 6660 个项目开工建设，其中中央预算内水利投资计划开工 3157 个，中央财政水利专项资金开工 3443 个，开工率分别为 66.2% 和 62.0%。

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17084 个，共有 16795 个项目开工建设，开工率为 98.3%。

四、投资完成情况


2013 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资 529.8 亿元，其中中央投资 298.3 亿元、地方配套投资 231.5 亿元，完成率分别为 40.9%（见图 3）和 34.1%。在完成的中央投资中，农村饮水安全工程 142.9 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固工程 6.4 亿元、灌区建设与节水改造工程 14.2 亿元、重大水利工程 134.8 亿元，完成率分别为 63.5%、25.6%、15.4% 和 34.8%。

图3 2013年中央预算内投资中央投资完成率
(按地区分)

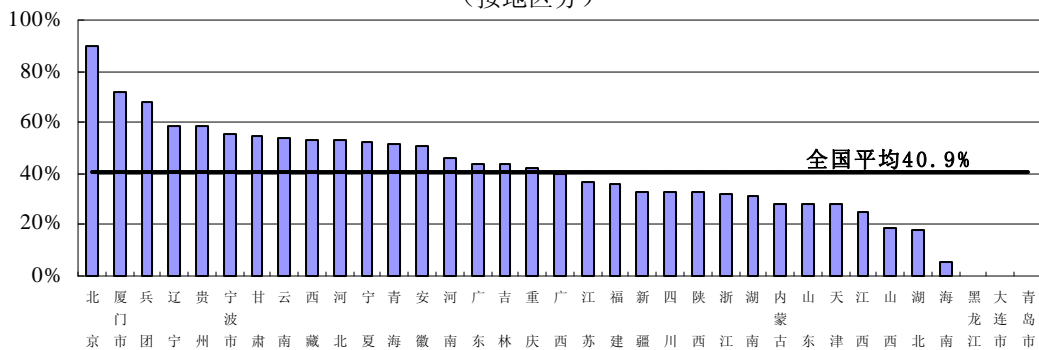

完成率分别为 19.2%（见图 4）和 21.5%。在完成的中央资金中，中小河流治理 75.8 亿元、小型病险水库除险加固 14.4 亿元、小型农田水利建设 23.1 亿元，完成率分别为 34.8%、13.1%和 9.6%。

图4 2013年中央财政水利专项投资完成率
(按地区分)

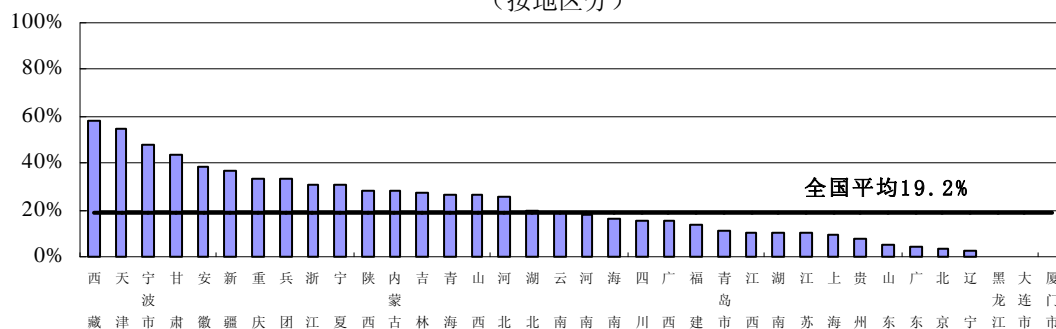

2012 年中央水利建设投资累计完成 2615.5 亿元，其中中央资金 1481.2 亿元、地方配套资金 1134.3 亿元，投资完成率分别为 94.7%和 93.1%。

五、工程进展情况

2013 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 5.9 亿立方米，石方 1.6 亿立方米，砼 1141.8 万立方米，金属结构 25.1 万吨。累计新建及加固堤防长度 2593 公里，河道清淤疏浚和岸线整治 2155 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 2177 公里，累计治理水土流失面积 1253 平方公里。

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印 130 份
